

INFORME DE AVANCE DE OBRA

# NATIVAS II

Barrio Nativas · Puertos del Lago, Escobar · 241 m<sup>2</sup> · 3 dormitorios

## TU INVERSIÓN ESTÁ ARRANCANDO

### HITOS DEL MES

COMPLETADO

Agrimensura

El lote ya está estacado.

COMPLETADO

Cálculo estructural

El informe de estructura ya está listo.

EN PROCESO

Planos y trámites de inicio

Presentación en barrio y municipalidad, a la espera de la aprobación.

### PRÓXIMOS HITOS

→ Cerco de obra y obrador

→ Acopio de materiales gruesos

→ Preparación platea

→ Hormigonado platea


### FOTOS DE LA OBRA



Lote estacado · vista general



Frente del terreno y acometidas

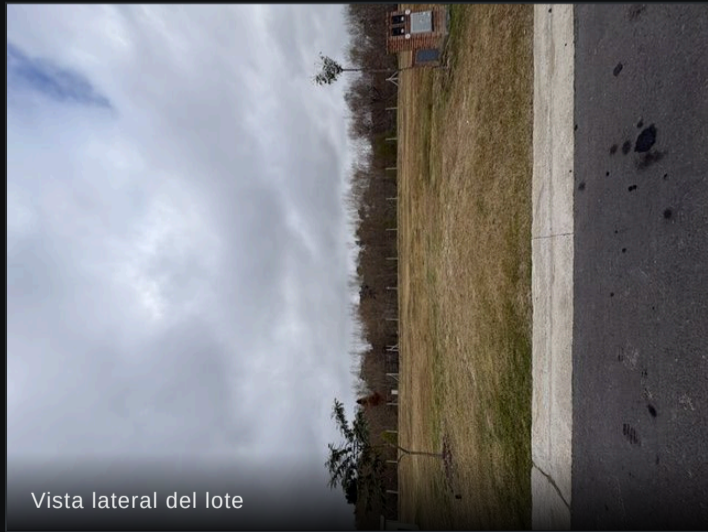

Vista lateral del lote



Entorno del Barrio Nativas

### AVANCE GENERAL DE OBRA

Progreso estimado total

2%
